


ID		Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predt	11 Feb '08							18 Feb '0	
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1		Projecto	94 dias?	13-02-08	20-06-08										
2		Repositório	11 dias?	13-02-08	27-02-08										
3		Templates	3 dias?	25-02-08	27-02-08										
4		(F1) Software Concept	94 dias?	13-02-08	20-06-08										
5		(D) Concept Paper	18 dias?	13-02-08	07-03-08										
6		Realização	16 dias?	13-02-08	05-03-08										
7		Revisao 3 (autores, revisores)	2 dias?	06-03-08	07-03-08	6									
8		(D) Change Control Plan	1 dia?	13-02-08	13-02-08										
9		(D) TOP 10 Risk List	18 dias?	13-02-08	07-03-08										
10		Realização	16 dias?	13-02-08	05-03-08										
11		Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	06-03-08	07-03-08	10									
12		(D) Software Project Log	94 dias?	13-02-08	20-06-08										
13		(F2) Requirements development	35 dias?	25-02-08	11-04-08										
14		(D) Quality Assurance Plan (includes template of code reviews)	5 dias?	25-02-08	29-02-08										
15		(D) Software Development Plan	16 dias?	25-02-08	17-03-08										
16		Realização	14 dias?	25-02-08	13-03-08										
17		Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	14-03-08	17-03-08	16									
18		(D) User Interface Prototype	26 dias?	25-02-08	31-03-08										
19		Software Requirements Specification	24 dias?	25-02-08	27-03-08										
20		Revisão 3 do restante (autores, revisores)	1 dia?	28-03-08	28-03-08	19									
21		Realização do Protótipo	17 dias?	05-03-08	27-03-08										
22		Insp. Das partes mais complexas	1 dia?	28-03-08	28-03-08	21									
23		Revisão 3 do restante (autores, revisores)	1 dia?	31-03-08	31-03-08	22									
24		(D) System Architecture	11 dias?	27-03-08	10-04-08										
25		Realização	8 dias?	27-03-08	07-04-08										
26		Insp. Das partes mais complexas	2 dias?	07-04-08	08-04-08										
27		Revisão 3 do restante (autores, revisores)	2 dias?	09-04-08	10-04-08	26									
28		(D) Software Test Cases	9 dias?	27-03-08	08-04-08										
29		Realização	8 dias?	27-03-08	07-04-08										

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa



Progresso




Marco



Sumário



Tarefa Agregada



Marco Agregado



Progresso Agregado



Dividir



Tarefas Externas



Resumo de Projecto



Agrupar por Sumário




Prazo




ID		Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Prede	11 Feb '08							18 Feb '0	
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
30		Insp. Das partes mais complexas	1 dia?	07-04-08	07-04-08										
31		revisão 3 do restante (autores, revisores)	1 dia?	08-04-08	08-04-08	30									
32		(D) Additional Spec Doc	7 dias?	03-04-08	11-04-08										
33		Realização	6 dias?	03-04-08	10-04-08										
34		Insp. Das partes mais complexas	1 dia?	11-04-08	11-04-08	33									
35		(F3) Architectural Design	15 dias?	07-04-08	25-04-08										
36		(D) Software Design and Architecture Doc	14 dias?	07-04-08	24-04-08										
37		Realização	10 dias?	07-04-08	18-04-08										
38		Inspeção	1 dia?	24-04-08	24-04-08										
39		(D) Software Integration Procedure	13 dias?	09-04-08	25-04-08										
40		Realização	8 dias?	09-04-08	18-04-08										
41		Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	24-04-08	25-04-08	40									
42		(D) Software Development Plan revised to include a Staged Delivery Plan	5 dias?	21-04-08	25-04-08										
43		Realização	3 dias?	21-04-08	23-04-08										
44		Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	24-04-08	25-04-08	43									
45		(F4) Detailed Design Stage 1	8 dias?	24-04-08	05-05-08										
46		(D) Detailed Design Doc	8 dias?	24-04-08	05-05-08										
47		Realização	7 dias?	24-04-08	02-05-08										
48		Insp	1 dia?	05-05-08	05-05-08										
49		(D) Software Construction Plan for this Stage	7 dias?	25-04-08	05-05-08										
50		Realização	6 dias?	25-04-08	02-05-08										
51		Revisão 3 (autores, revisores)	1 dia?	05-05-08	05-05-08										
52		(F5) Coding and debugging for Stage 1	13 dias?	05-05-08	21-05-08										
53		(Code) Code for this Stage developed	13 dias?	05-05-08	21-05-08										
54		Realização	10 dias?	05-05-08	16-05-08										
55		Revisão de Forma	1 dia?	20-05-08	20-05-08										
56		Insp de conteúdo 1 módulo	2 dias?	20-05-08	21-05-08										
57		Revisão 3 do restante (autores, revisores)	2 dias?	20-05-08	21-05-08										
58		(D) Outcome of tests in this Stage (Update of Software Test Cases Doc)	10 dias?	05-05-08	16-05-08										

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa



Tarefa Agregada



Tarefas Externas



Progresso



Marco Agregado



Resumo de Projecto



Marco



Progresso Agregado




Agrupar por Sumário



Sumário



Dividir




Prazo



ID		Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predt	11 Feb '08							18 Feb '0	
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
59		(F6) Software Release	4 dias?	15-05-08	20-05-08										
60		(D) Delivery description	4 dias?	15-05-08	20-05-08										
61		Realização	2 dias?	15-05-08	16-05-08										
62		Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	19-05-08	20-05-08	61									
63		(F4) Detailed Design Stage 2	7 dias?	13-05-08	21-05-08										
64		(D) Detailed Design Doc	6 dias?	13-05-08	20-05-08										
65		Realização	4 dias?	13-05-08	16-05-08										
66		Insp	1 dia?	20-05-08	20-05-08										
67		(D) Software Construction Plan for this Stage	4 dias?	16-05-08	21-05-08										
68		Realização	2 dias?	16-05-08	19-05-08										
69		Revisão 3 (autores, revisores)	1 dia?	21-05-08	21-05-08	50									
70		(F5) Coding and debugging for Stage 2	9 dias?	22-05-08	03-06-08										
71		(Code) Code for this Stage developed	8 dias?	22-05-08	02-06-08										
72		Realização	5 dias?	22-05-08	28-05-08										
73		Revisão de Forma	2 dias?	28-05-08	29-05-08										
74		Insp de conteúdo de 1 módulo	2 dias?	30-05-08	02-06-08										
75		Revisão 3 do restante (autores, revisores)	2 dias?	30-05-08	02-06-08										
76		(D) Outcome of tests in this Stage (Update of Software Test Cases Doc)	4 dias?	27-05-08	30-05-08										
77		User Acceptance testing	4 dias?	28-05-08	02-06-08										
78		Realização	3 dias?	28-05-08	30-05-08										
79		Revisão	1 dia?	02-06-08	02-06-08										
80		Installation Manual	3 dias?	30-05-08	03-06-08										
81		Realização	2 dias?	30-05-08	02-06-08										
82		Revisão	1 dia?	03-06-08	03-06-08										
83		(F6) Software Release	73 dias?	28-02-08	09-06-08										
84		(D) Delivery description	3 dias?	29-05-08	02-06-08										
85		Realização	2 dias?	29-05-08	30-05-08										
86		Revisão 3 (autores, revisores)	1 dia?	02-06-08	02-06-08										
87		(Code) Final program completed	18 dias?	12-05-08	04-06-08										

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa



Progresso




Marco



Sumário



Tarefa Agregada



Marco Agregado



Progresso Agregado



Dividir



Tarefas Externas



Resumo de Projecto





Agrupar por Sumário



Prazo



ID		Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Pred	11 Feb '08							18 Feb '0	
88		Archival Media for everything, docs and code	73 dias?	28-02-08	09-06-08		S	T	Q	Q	S	S	D	S	T


Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08


Tarefa


Progresso


Marco

Sumário











Tarefa Agregada


Marco Agregado


Progresso Agregado

Dividir











Tarefas Externas


Resumo de Projecto


Agrupar por Sumário


Prazo









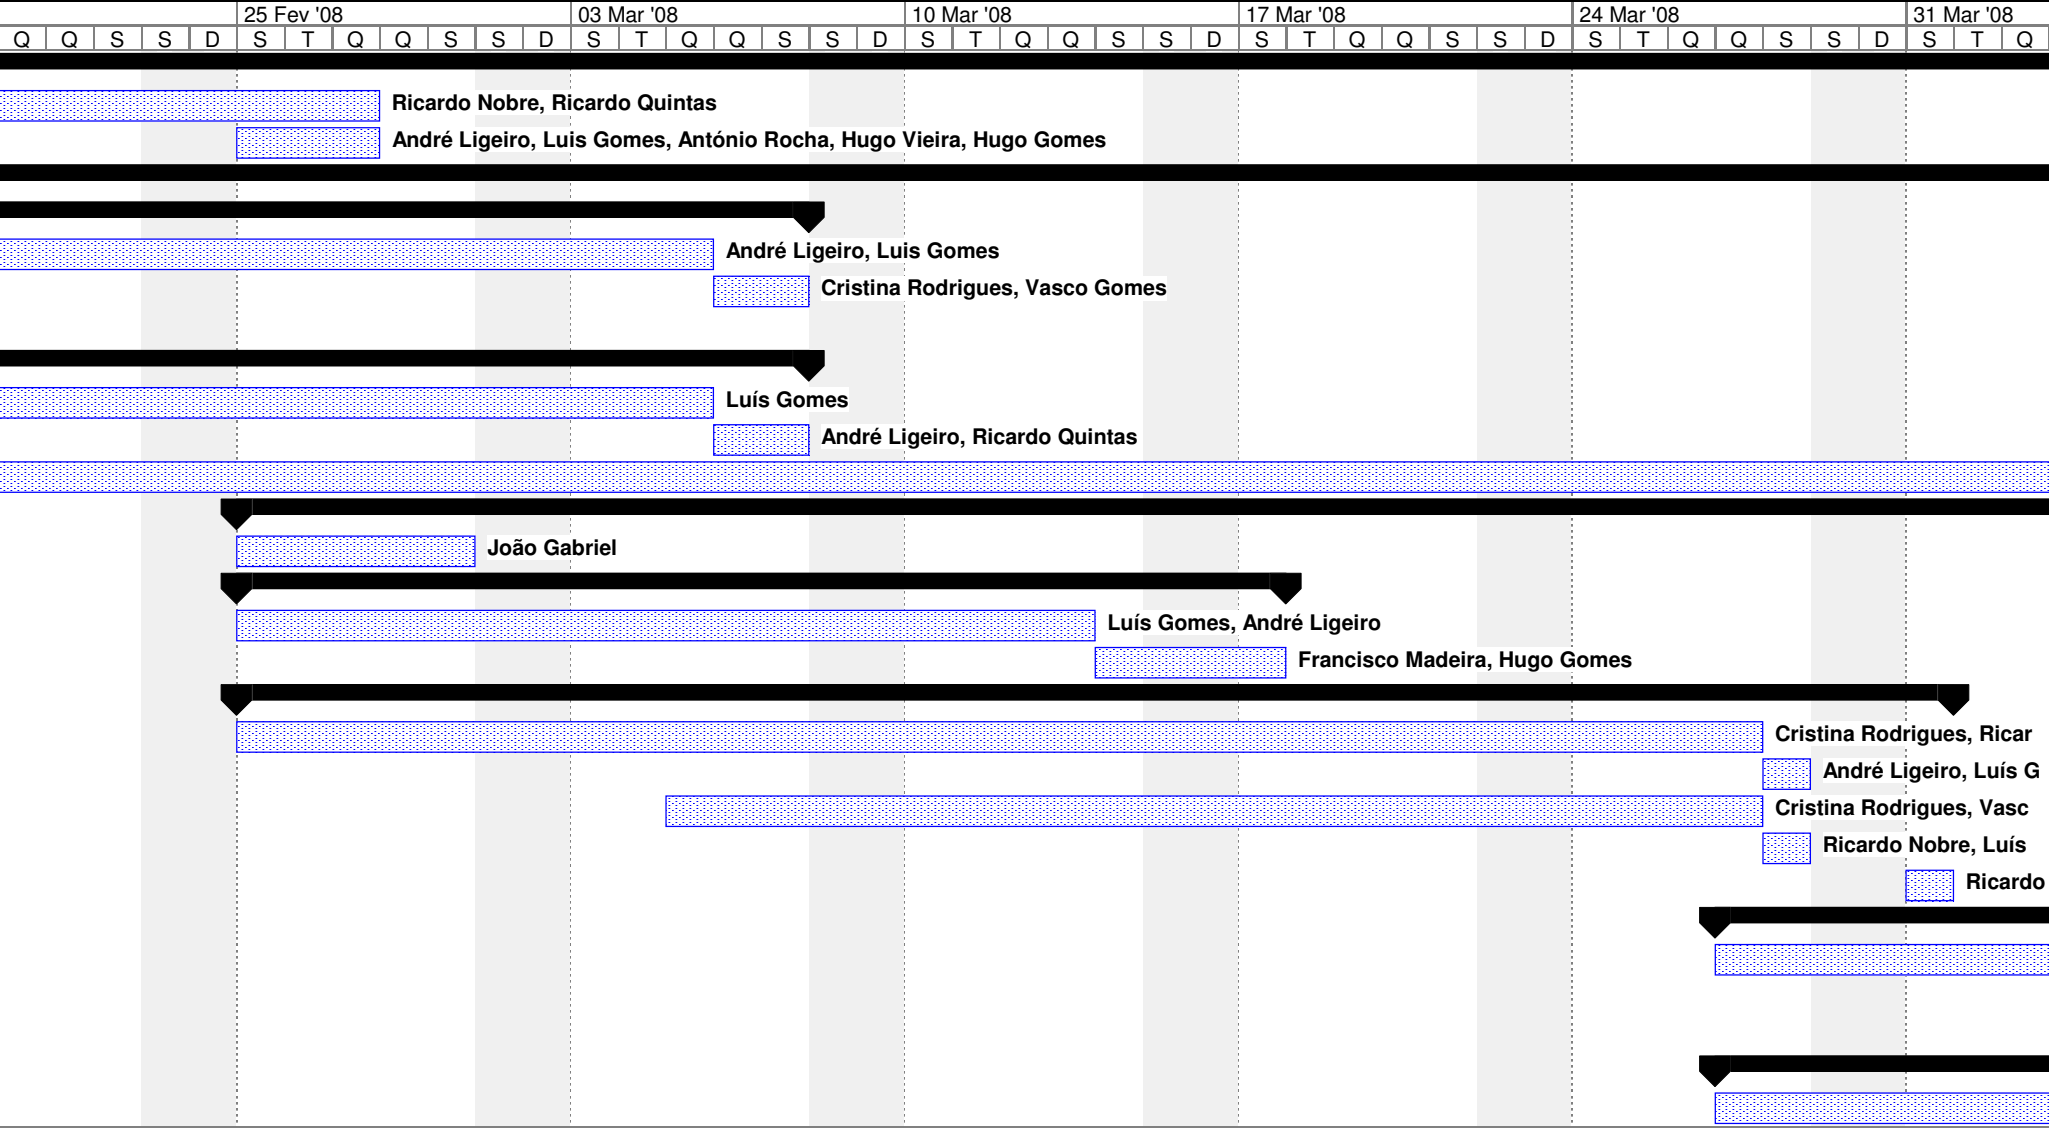

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa

Progresso

Marco

Sumário

Tarefa Agregada

Marco Agregado

Progresso Agregado


Dividir

Tarefas Externas

Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário

Prazo

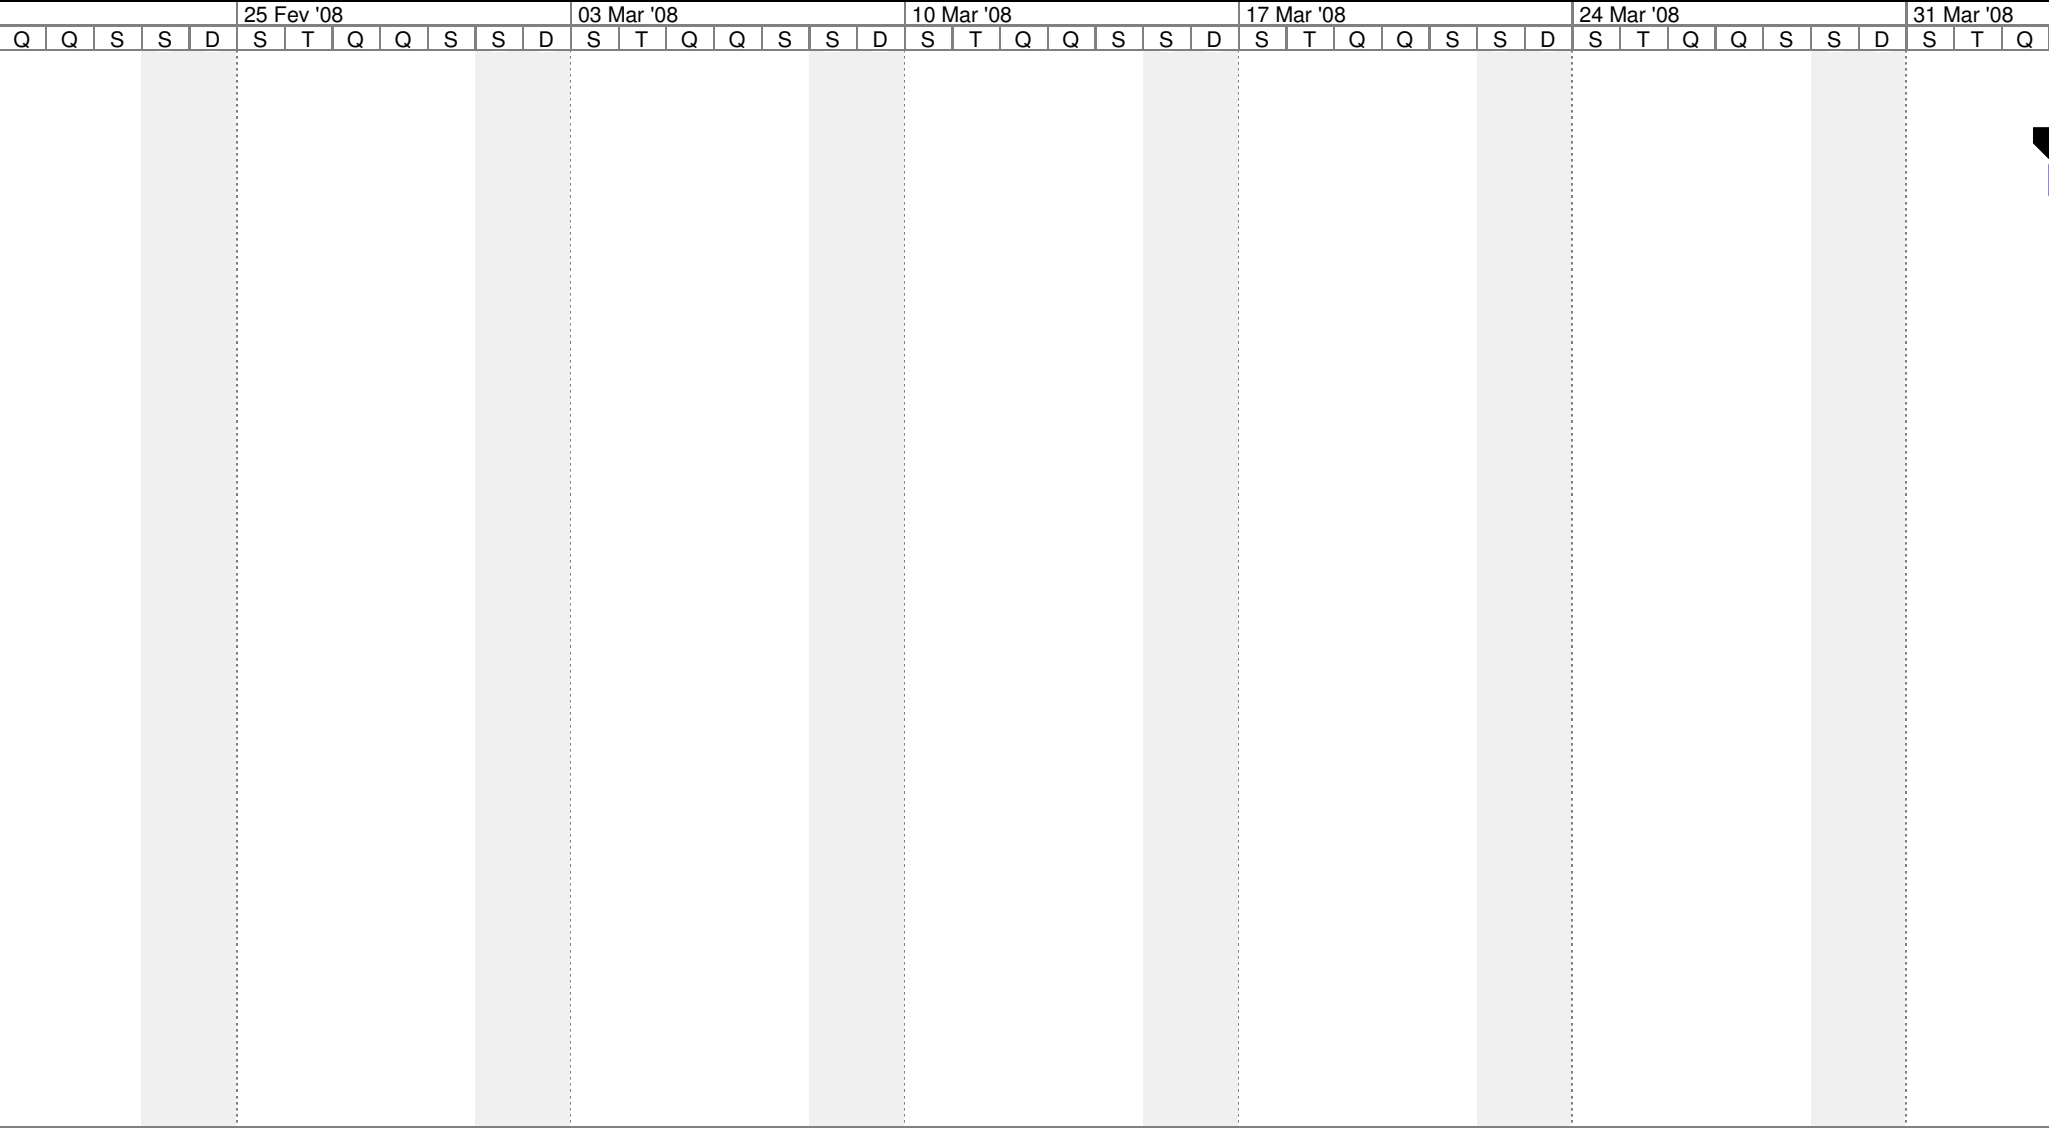


Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08


Tarefa


Progresso


Marco

Sumário











Tarefa Agregada


Marco Agregado


Progresso Agregado

Dividir











Tarefas Externas


Resumo de Projecto


Agrupar por Sumário


Prazo










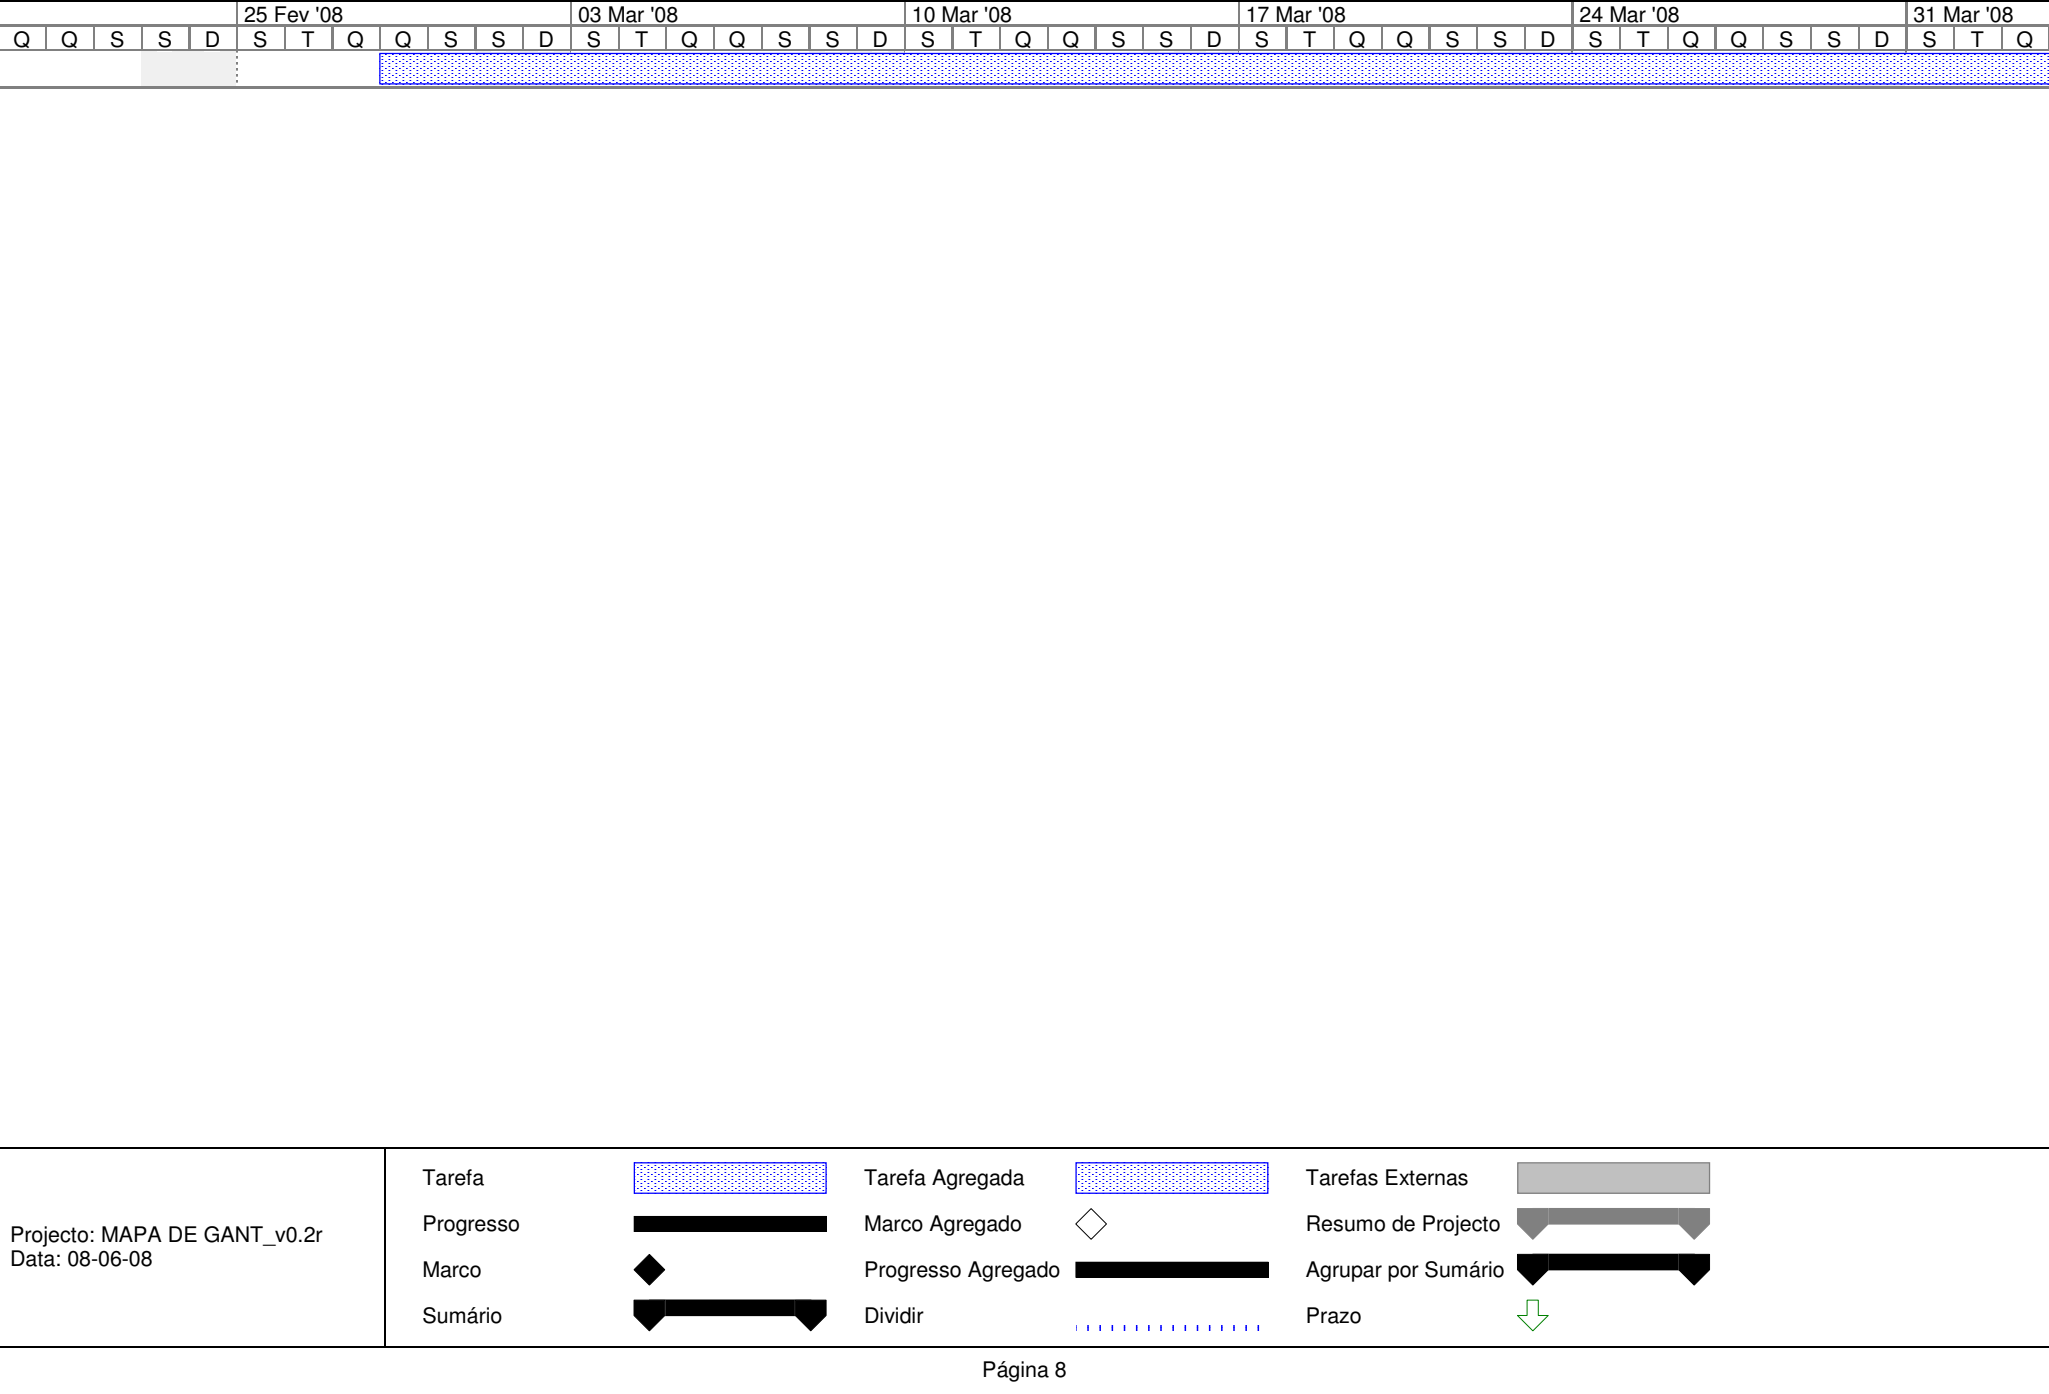

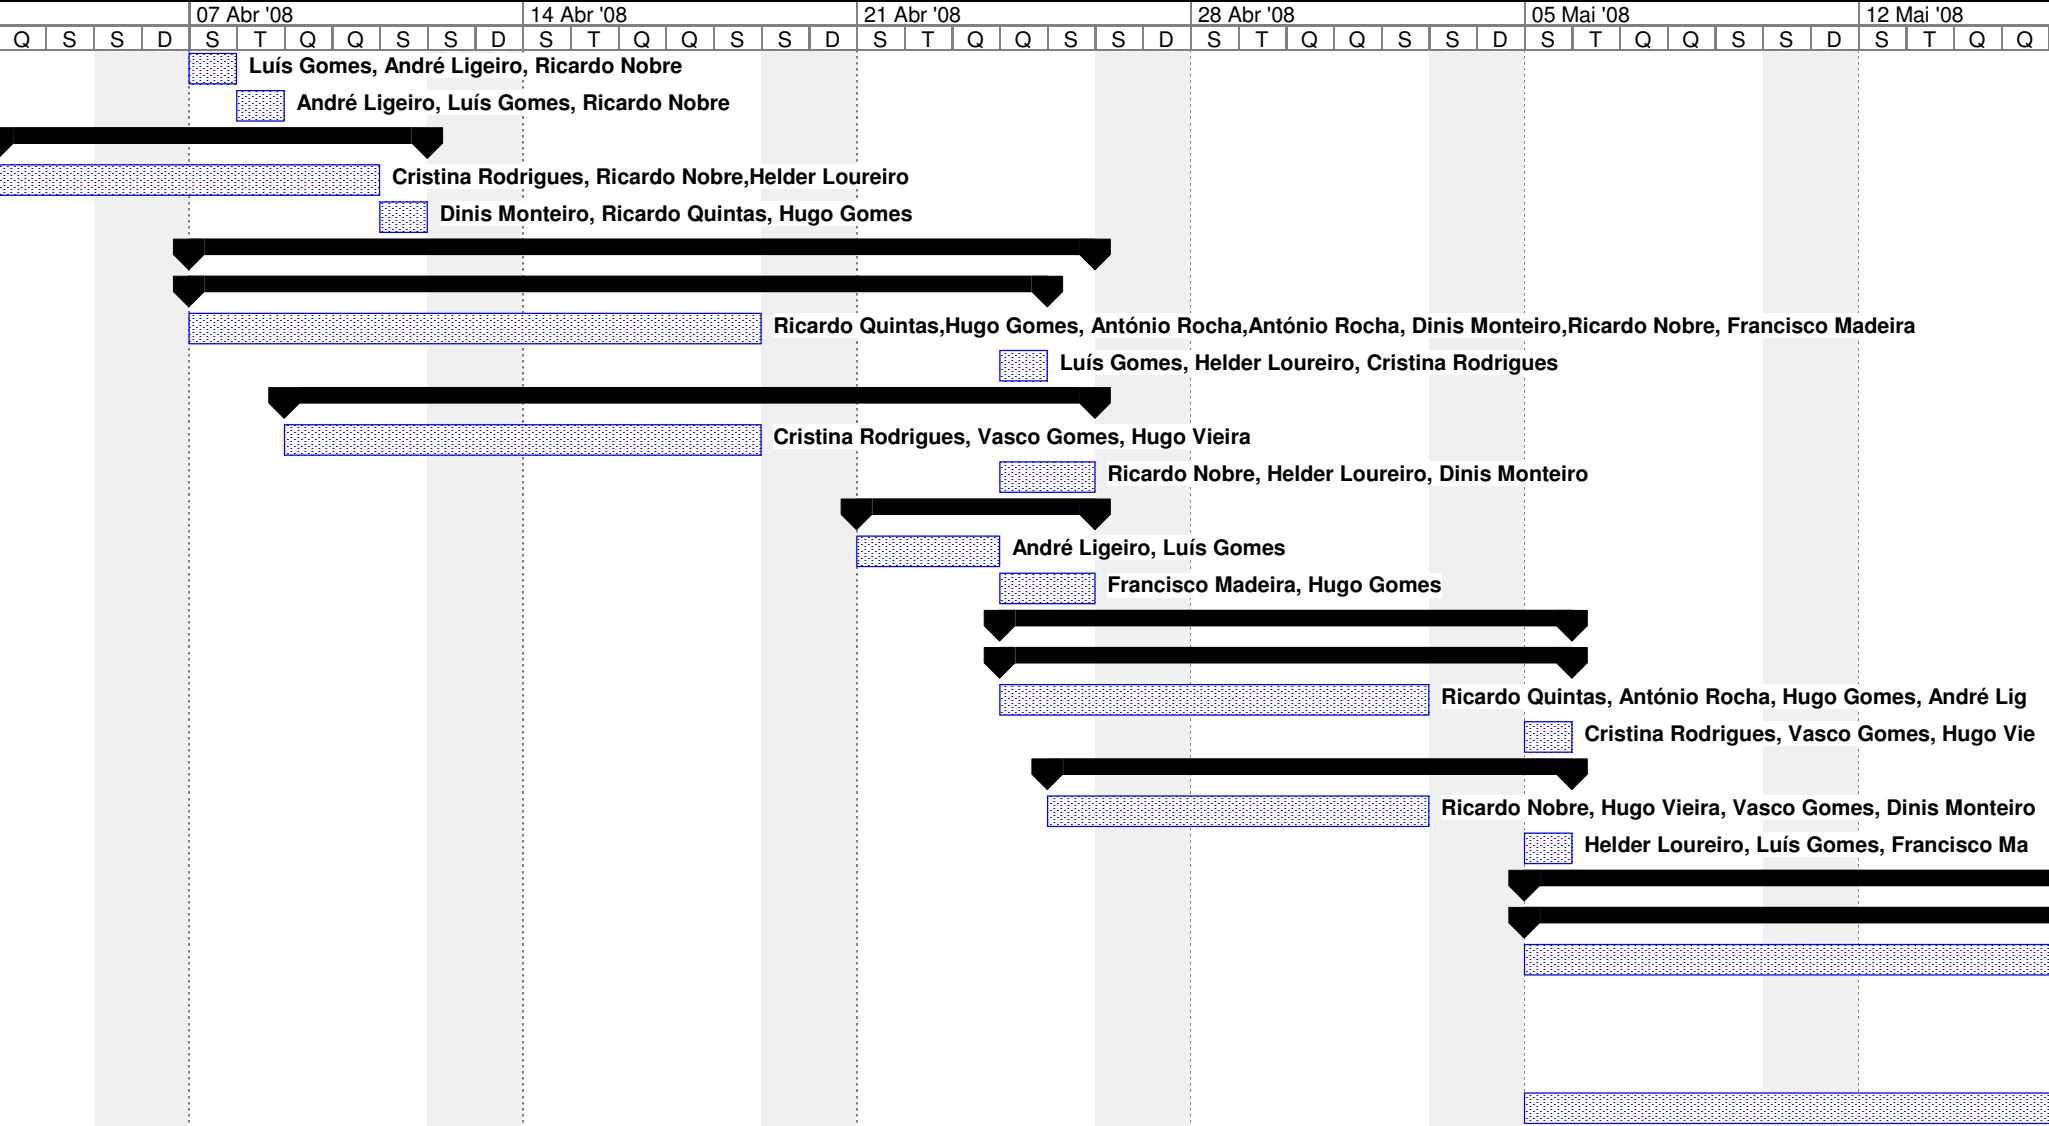

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa

Progresso

Marco

Sumário

Tarefa Agregada

Marco Agregado

Progresso Agregado

Dividir

Tarefas Externas

Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário

Prazo

07 Abr '08

S

T

Q

Q

S

S

D

14 Abr '08

S

T

Q

Q

S

S

D

21 Abr '08

S

T

Q

Q

S

S

D

28 Abr '08

S

T

Q

Q

S

S

D

05 Mai '08

S

T

Q

Q

S

S

D

12 Mai '08

S

T

Q

Q

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa

Progresso

Marco

Sumário

Tarefa Agregada

Marco Agregado

Progresso Agregado

Dividir

Tarefas Externas

Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário

Prazo

Página 12



Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r
Data: 08-06-08

Tarefa

Progresso

Marco

Sumário

Tarefa Agregada

Marco Agregado

Progresso Agregado


Dividir

Tarefas Externas

Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário

Prazo

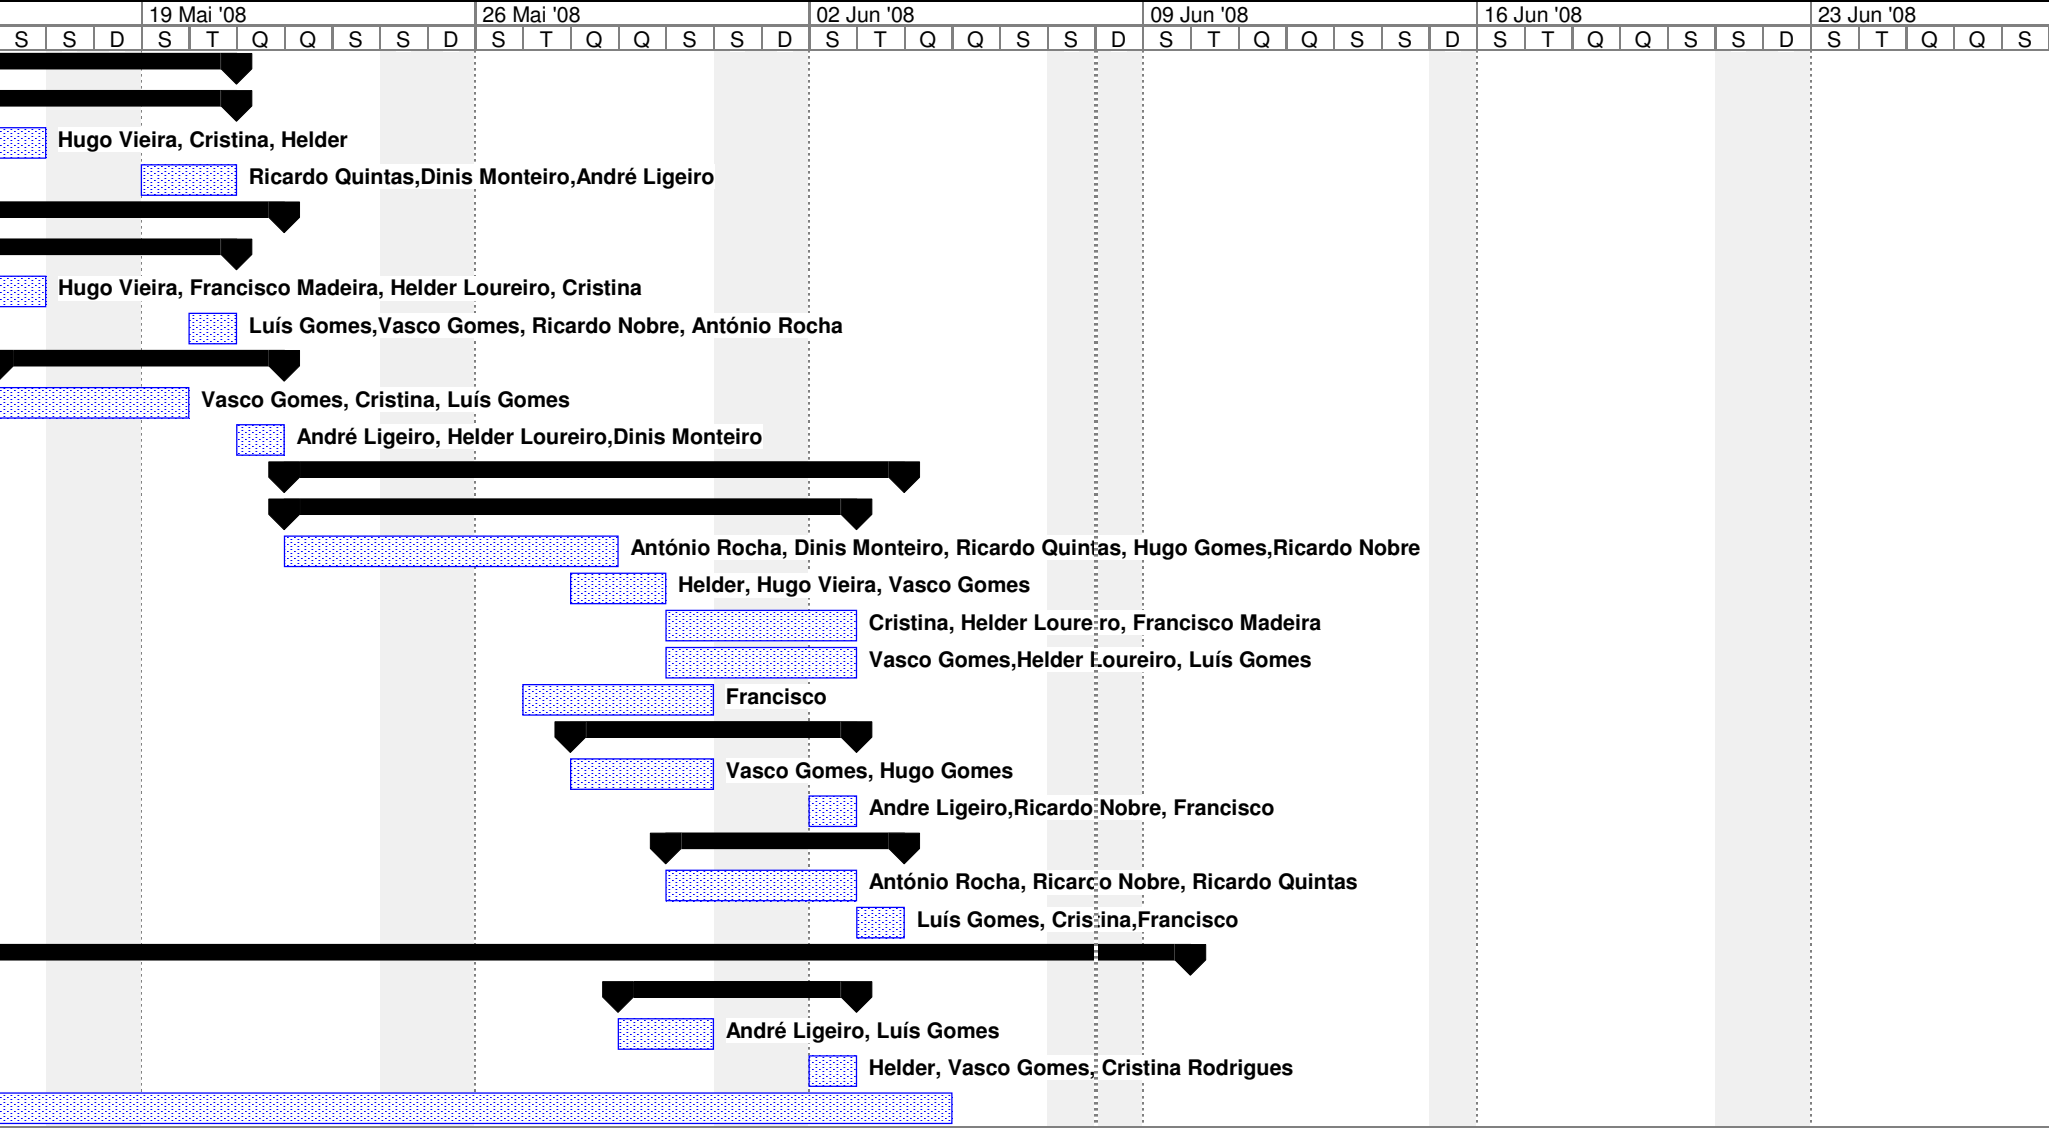

Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r Data: 08-06-08	Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefas Externas	
	Progresso		Marco Agregado		Resumo de Projecto	
	Marco		Progresso Agregado		Agrupar por Sumário	
	Sumário		Dividir		Prazo	

			19 Mai '08						26 Mai '08						02 Jun '08						09 Jun '08						16 Jun '08						23 Jun '08				
S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S		
																		Ricardo Nobre																			



<div>Projecto: MAPA DE GANT_v0.2r</div> <div>Data: 08-06-08</div>	Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefas Externas	
	Progresso		Marco Agregado		Resumo de Projecto	
	Marco		Progresso Agregado		Agrupar por Sumário	
	Sumário		Dividir		Prazo	
